LATVIJAS REPUBLIKAS FINANŠU MINISTRIJA

NACIONĀLAIS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Savienības struktūrfondi un Kohēzijas fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

# Eiropas Savienības fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda ieviešana

04.06.2015.

# Saturs

1. ES fondu plānošanas modelis un finansējuma shēma 2014.–2020.gada plānošanas periodam
2. 2014.–2020.gada plānošanas perioda ieviešanas shēma
3. Ex-ante nosacījumu izpilde
4. Kohēzijas politikas investīciju tempi 2014.–2020.gada plānošanas perioda sākumā
5. Snieguma ietvara mērķi 2018.gadam
6. ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda uzsākšanas progress
7. ES fondu sasaiste ar NAP2020 uzdevumiem

# ES fondu plānošanas modelis un finansējuma shēma 2014.–2020.gada plānošanas periodam

LATVIJAS REPUBLIKAS FINANŠU MINISTRIJA



# 2014.–2020.gada plānošanas perioda ieviešanas shēma

| | |
|---|---|
| EX-ante nosacījumu izpilde | •571,86 mEUR / 13,03% apmērā no kopējā ES fondu finansējuma netiks attiecināti, ja netikts izpildīti Partnerības līgumā noteiktie ex-ante nosacījumi |
| Sākotnējais novērtējums un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji apstiprināti UK | •1 226,35 mEUR / 27,94% apmērā no kopējā ES fondu finansējuma ir apstiprināti projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji UK |
| Izstrādāti Ministru kabineta noteikumi | •685,20 mEUR / 15,61% apmērā no kopējā ES fondu finansējuma ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi par SAM ieviešanu |
| Atlases kārtu izsludināšana, projektu apstiprināšana, projektu ieviešana | • 1,11 mEUR / 0,03% apmērā no kopējā ES fondu finansējuma ir izsludinātas projektu iesniegumu atlases |

# Ex-ante nosacījumu izpilde




Atbilstoši Vispārējās regulas 19.panta 5.punktā noteiktajam Eiropas Komisija ir tiesīga neveikt maksājumus attiecīgajā prioritārajā virzienā, ja nav laikā izpildīti tam saistošie ex-ante nosacījumi.
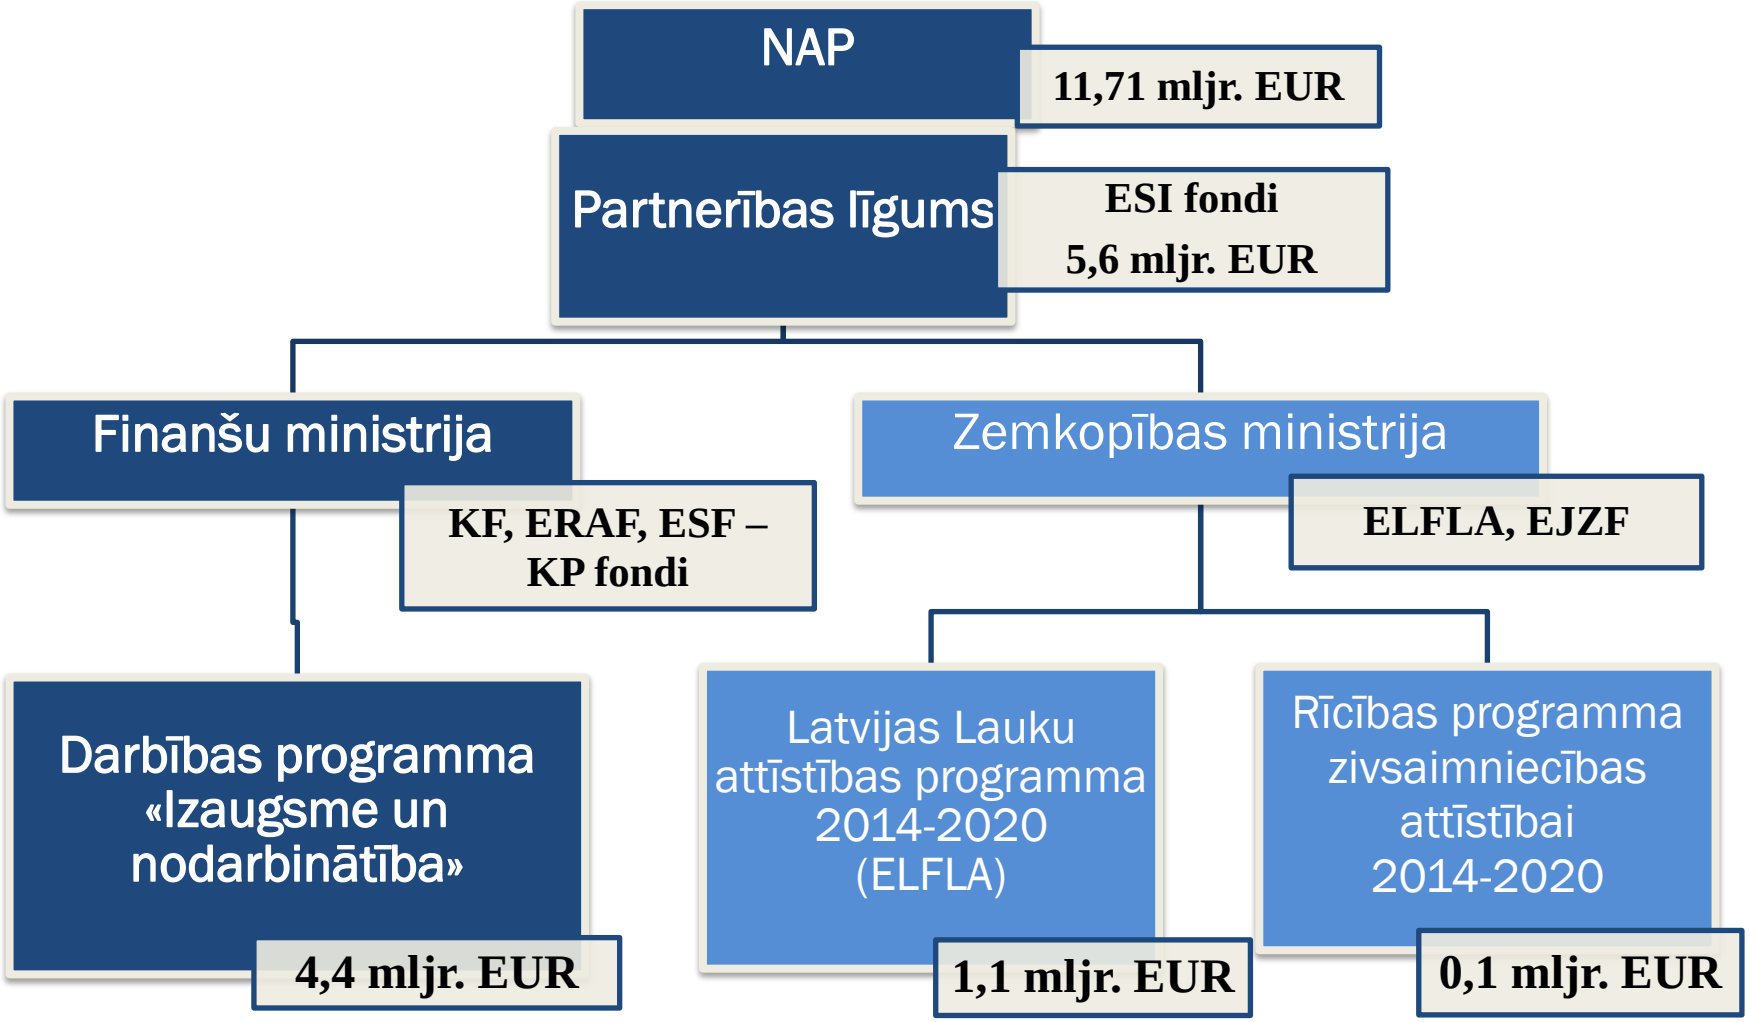
# Kohēzijas politikas investīciju tempi jākāpina 2014-2020 perioda sākumā

nepieļaujot iepriekšējo periodu kļūdas (avansi, finanšu instrumenti bez seguma-bez «kustības» ekonomikā)

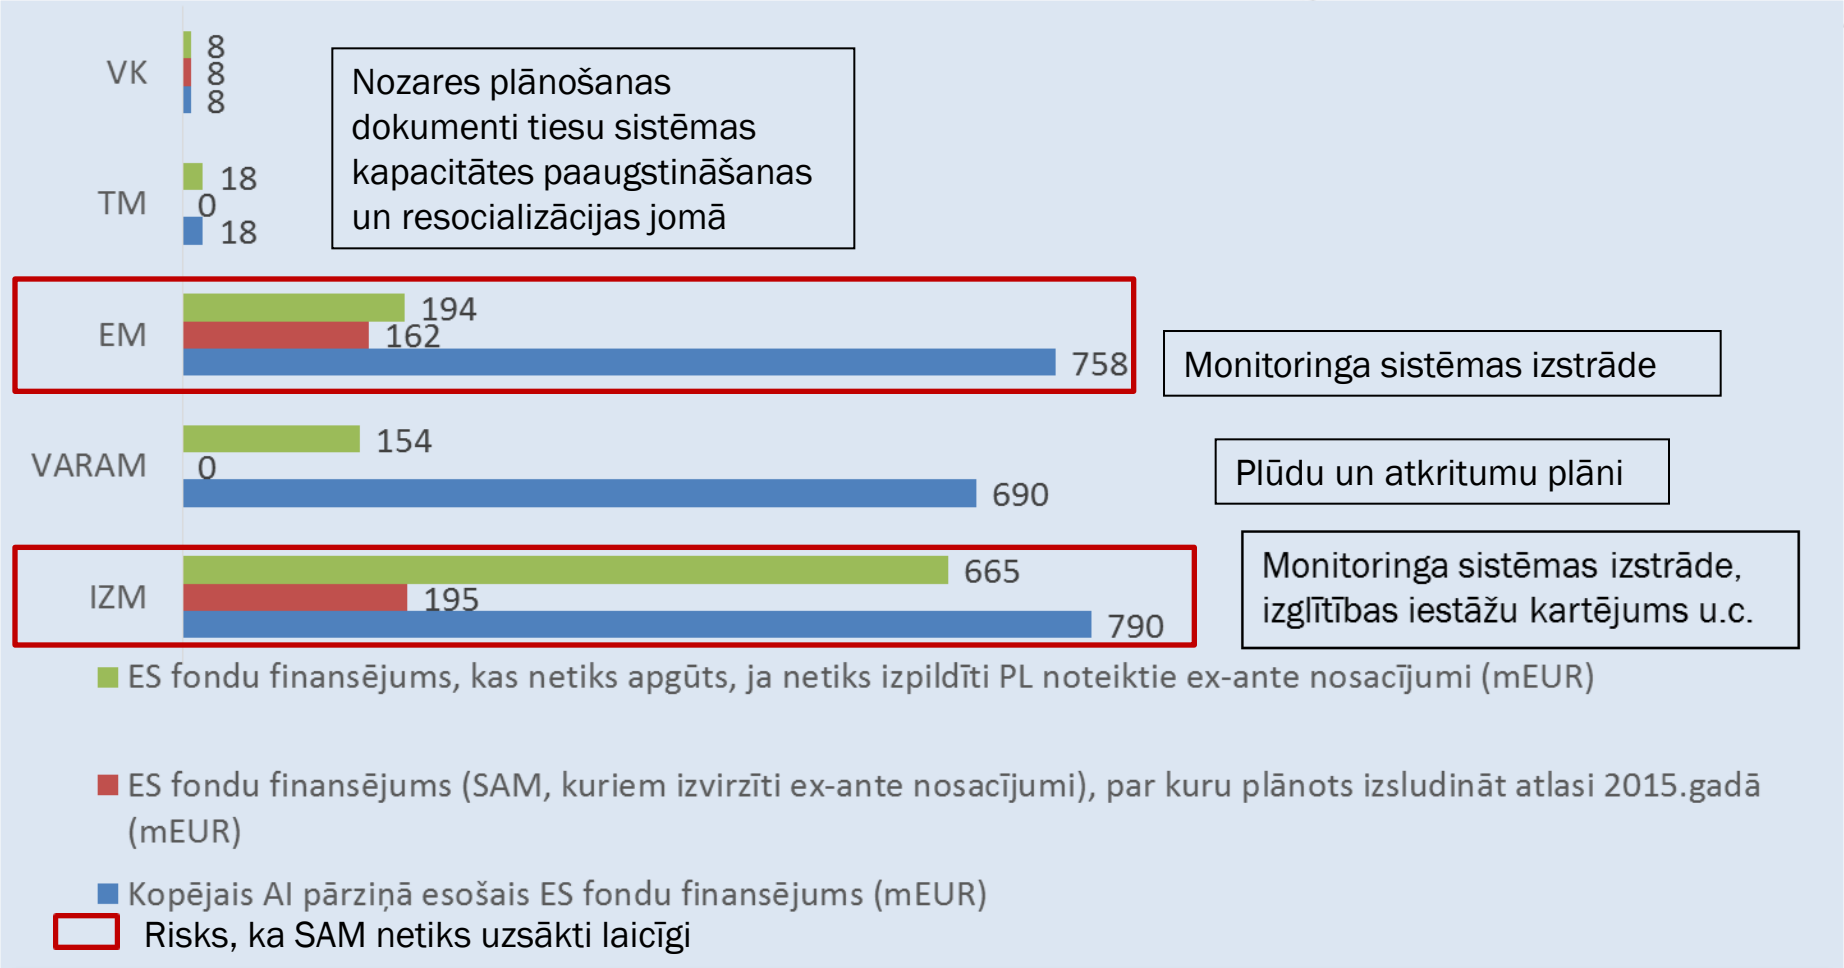


| Budžeta izdevumu tempu salīdzinājums | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Periods | 1.gads | 2.gads | 3.gads | 4.gads | 5.gads |
| 2007-2013 | 0,5% | 3,8% | 11,7% | 14,8% | 15,7% |
| 2014-2020 pesimistiski | 0,3% | 2,3% | 6,7% | 10,3% | 10,1% |
| 2014-2020 optimistiski | 0,3% | 2,1% | 10,5% | 13,3% | 15,9% |

- "Optimistiskā" prognoze 2014-2020 plānošanas periodam, balstoties uz Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" papildinājumā minētajiem pasākumu laika grafikiem (4 981 mEUR)
- Prognoze 2007-2013 plānošanas periodam (5 220 mEUR)
- "Pesimistiskā" prognoze 2014-2020 plānošanas periodam - ieplānota budžetā, ņemot vērā līdzšinējās budžeta izpildes plānu nobīdes
- Kopā abos periodos, pieņemot optimistisko scenāriju 2014-2020 periodam (6 555 mEUR)
- Kopā abos periodos 2014-2018.gados, pieņemot pesimistisko scenāriju 2014-2020 periodam (3 049 mEUR)

# Snieguma ietvara mērķi 2018.gadam, mEUR

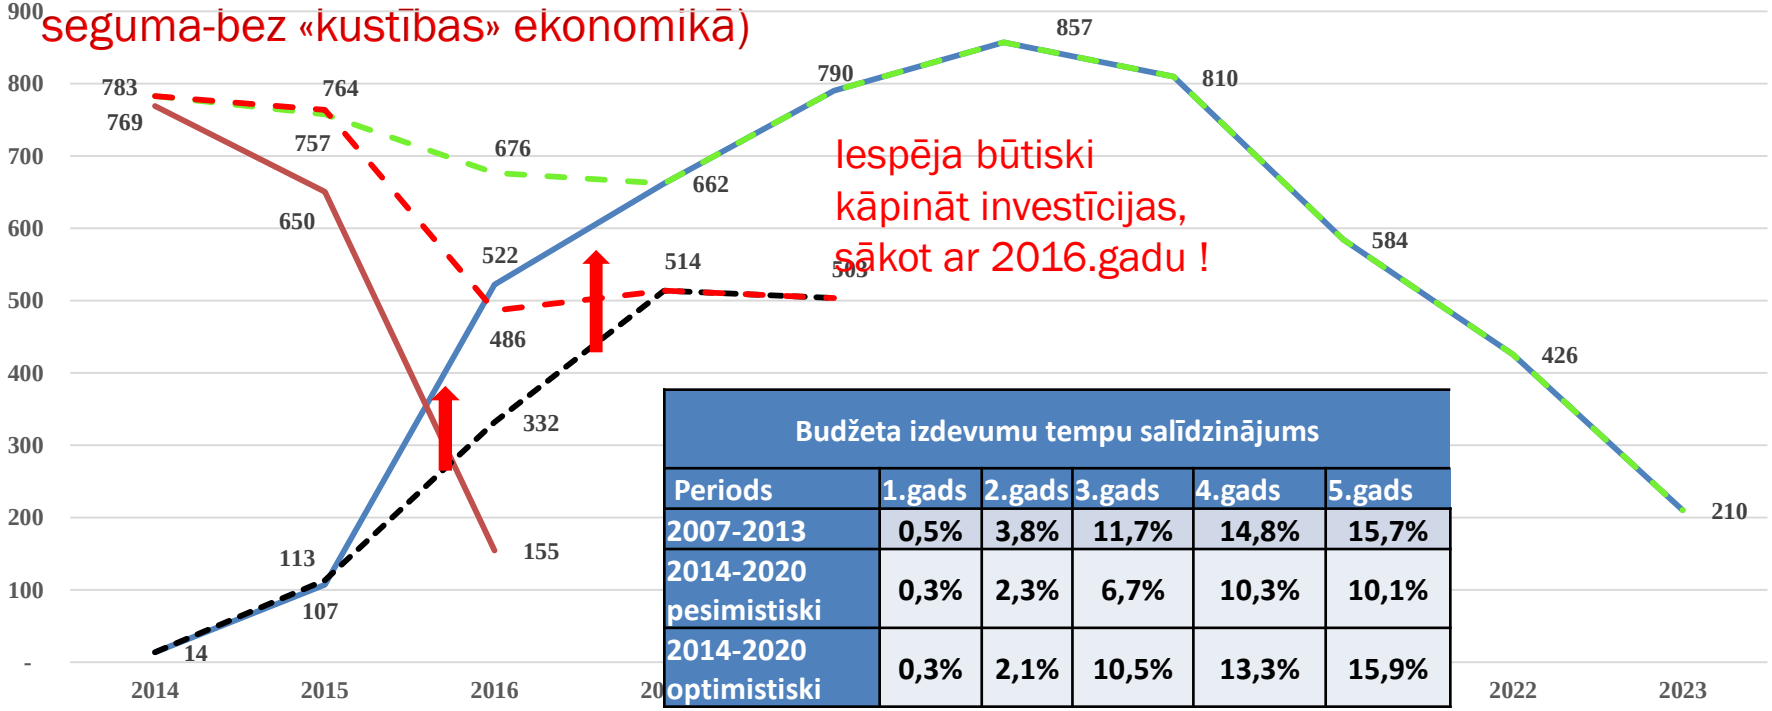


- 2017.gada kopējie N+3 mērķi (489 mEUR)
- Ja netiks sasniegti 85% no 2018.gada snieguma ietvara mērķiem, Eiropas Komisija var neizmaksāt 6% no SAM finansējuma rezerves (261 mEUR)

# ES fondu sasaiste ar NAP2020 uzdevumiem




- NAP2020 kopējais finansējums uzdevumiem, kurus paredzēts īstenot no citiem finanšu resursiem (mljr.EUR)
- NAP2020 kopējais finansējums uzdevumiem, kurus paredzēts īstenot ar ES fondu atbalstu (mljr.EUR)
- NAP2020 kopējais finansējums uzdevumiem, kas netika atbalstīti finansēšanai no ES fondiem (mljr.EUR)
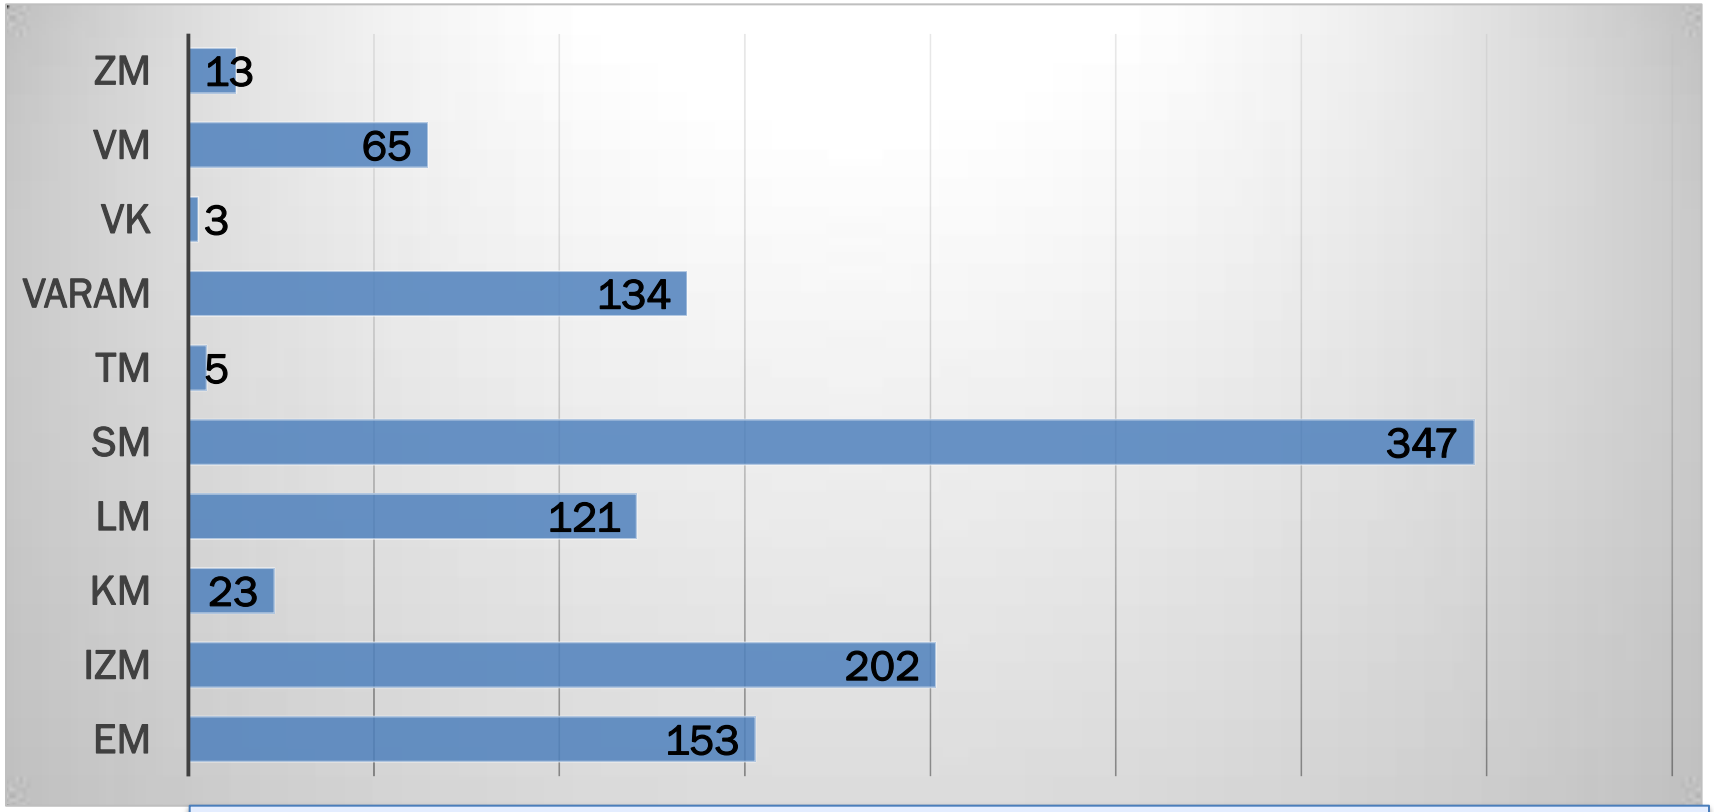
# SAM ieviešanas laika grafiks SM




SM pārziņā esošie SAM ir finansiāli visapjomīgākie, attiecīgi, lai varētu uzsākt SAM īstenošanu, nepieciešama padziļināta izpēte, vienlaikus pastiprinātu uzmanību pievēršot ieviešanas laika grafikam.
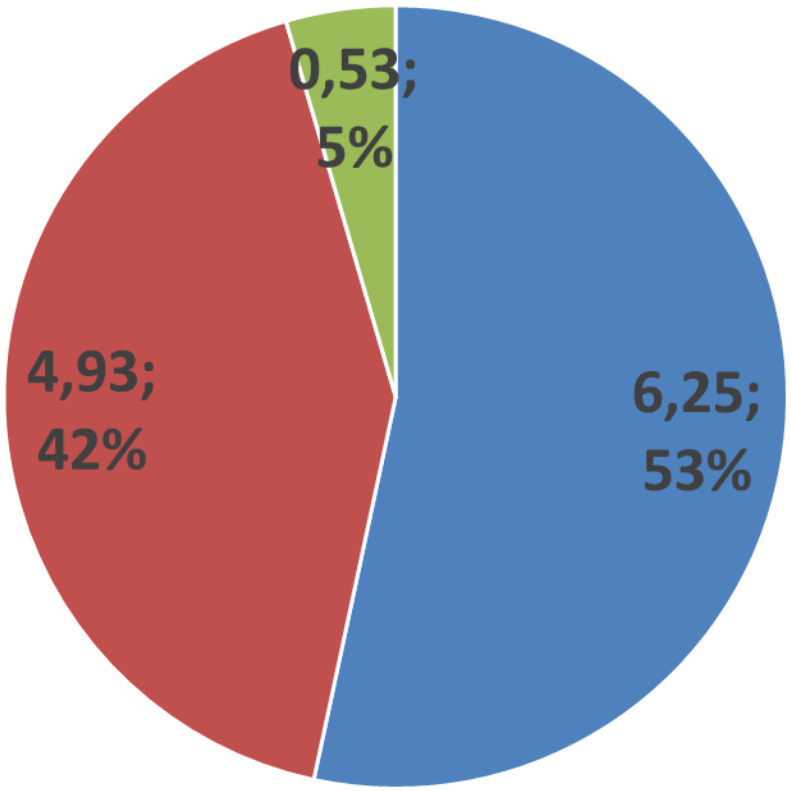
# SAM ieviešanas laika grafiks KM, TM




KM jāspēj pamatot lielo kultūras un sporta objektu attiecināmību, lai nodrošinātu atbilstību Eiropas Komisijas nosacījumiem (5 mEUR kopējās projekta izmaksas).

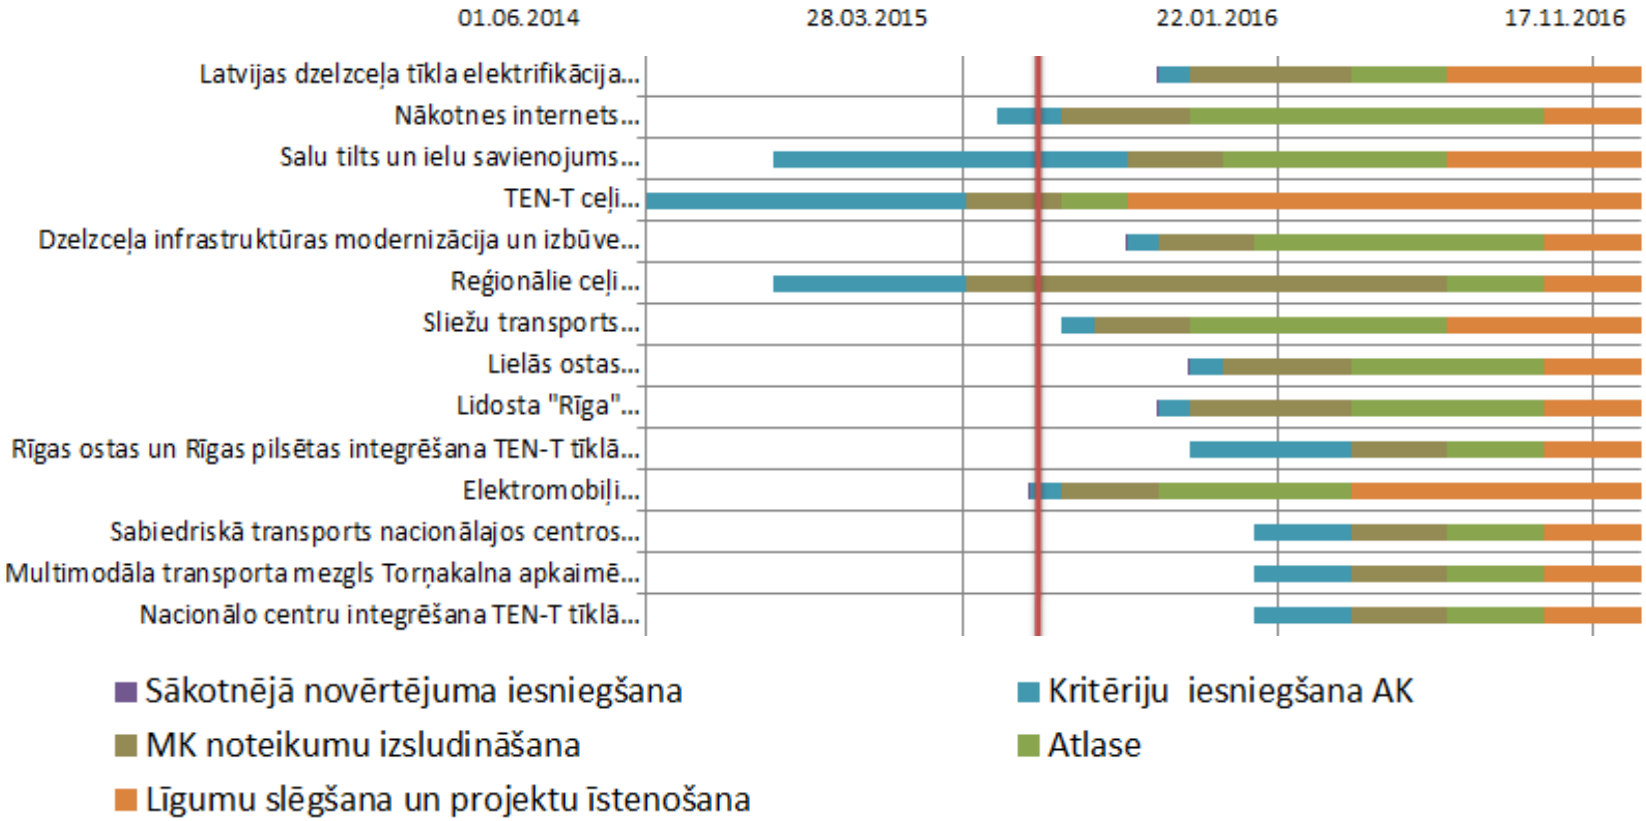Ņemot vērā, ka TM plāno ieviešanas nosacījumus izstrādāt tikai ar 2016.gadu, pastāv risks, ka netiks sasniegti snieguma ietvarā noteiktie mērķi.

# SAM ieviešanas laika grafiks VK, VM

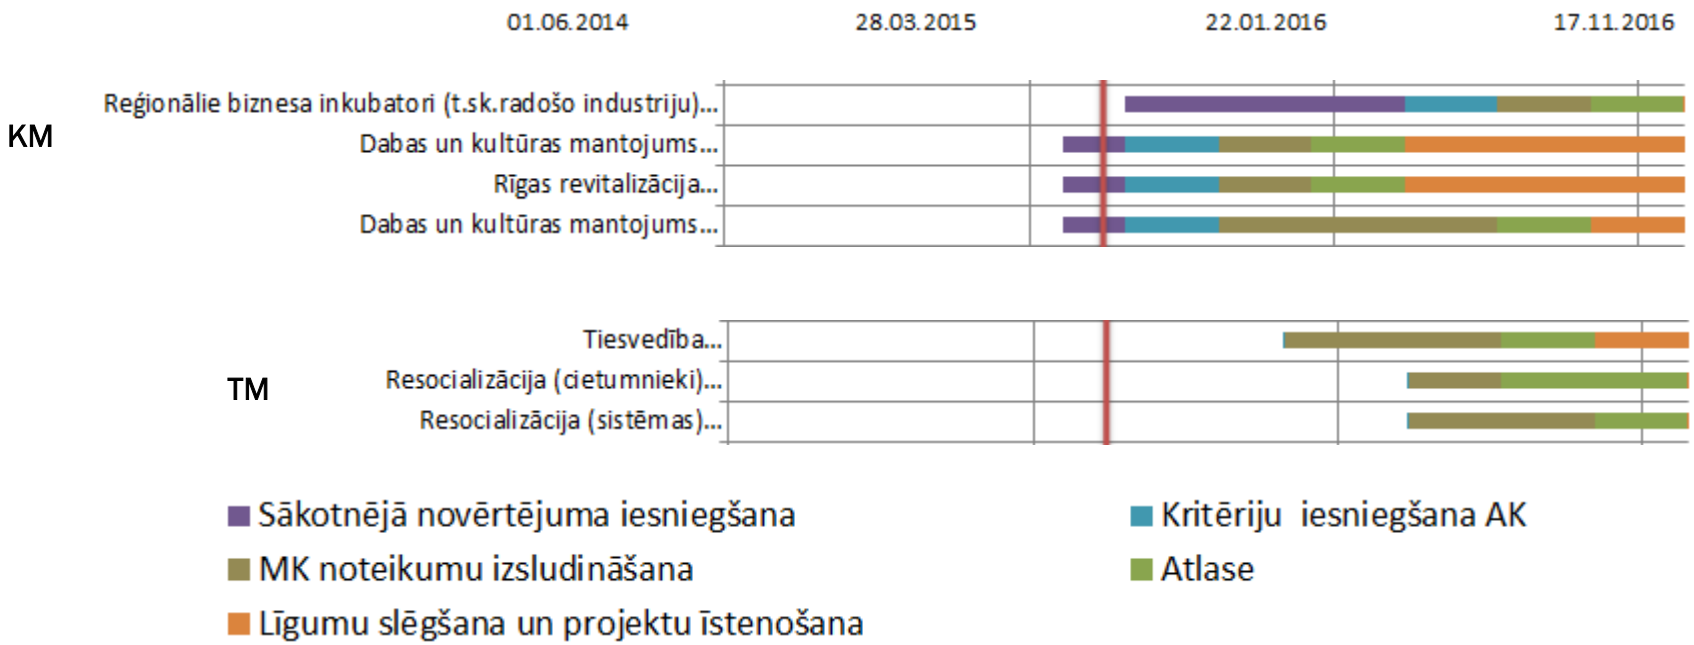


VK šobrīd strādā pie SAM ieviešanas nosacījumu izstrādes, lai atlasi varētu izsludināt līdz šī gada jūlija beigām.

Tiek izstrādāts Pasaules Bankas pētījums, kura ietvaros tiks pamatoti nepieciešamie ieguldījumi veselības infrastruktūrā, kas ir priekšnosacījums ERAF SAM ieviešanai.

# SAM ieviešanas laika grafiks EM

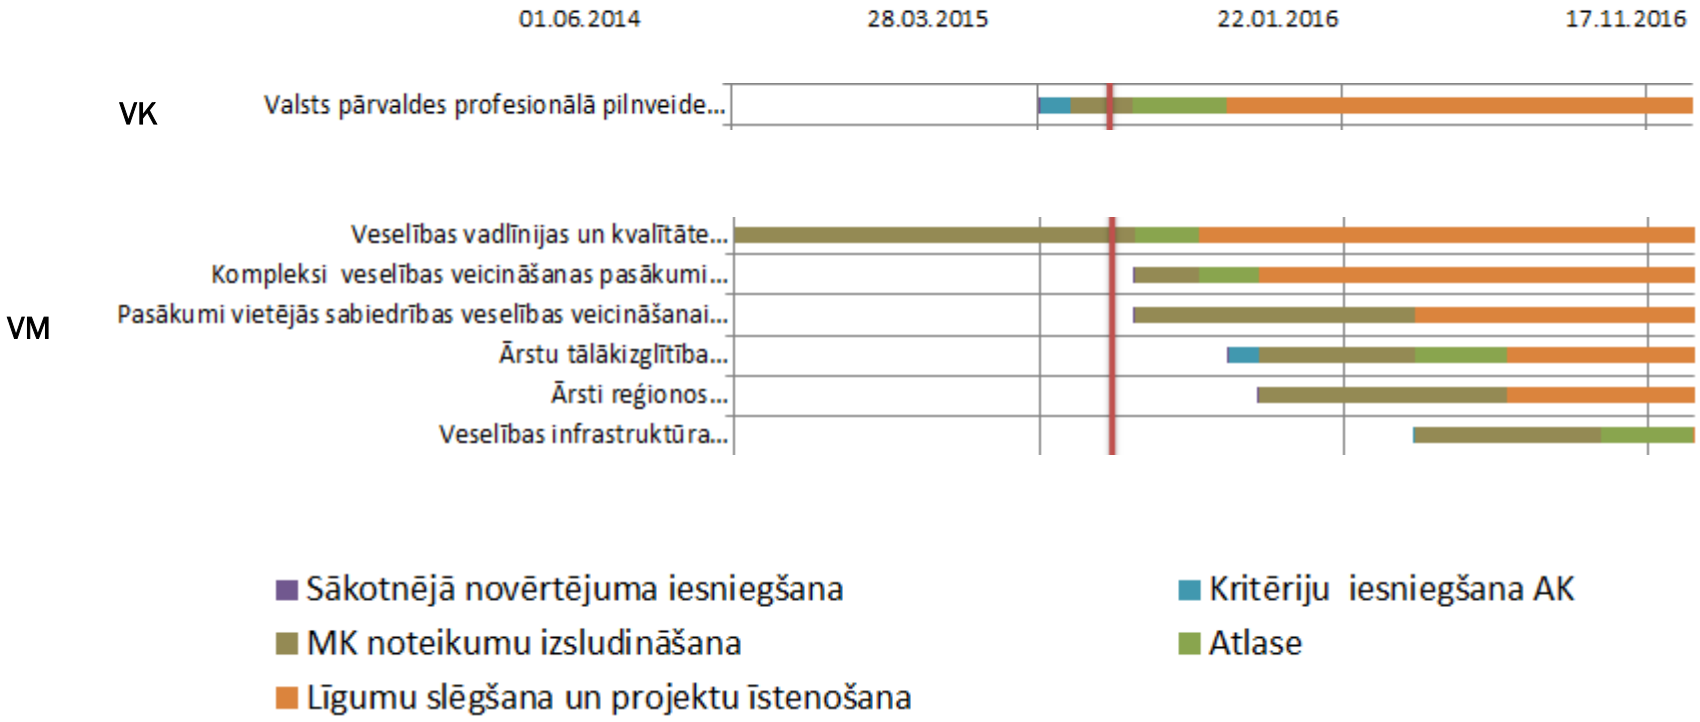


Būtiski nodrošināt savlaicīgu SAM ieviešanu, lai nebūtu investīciju pārrāvumi.

# SAM ieviešanas laika grafiks IZM

LATVIJAS REPUBLIKAS
FINANŠU MINISTRIJA

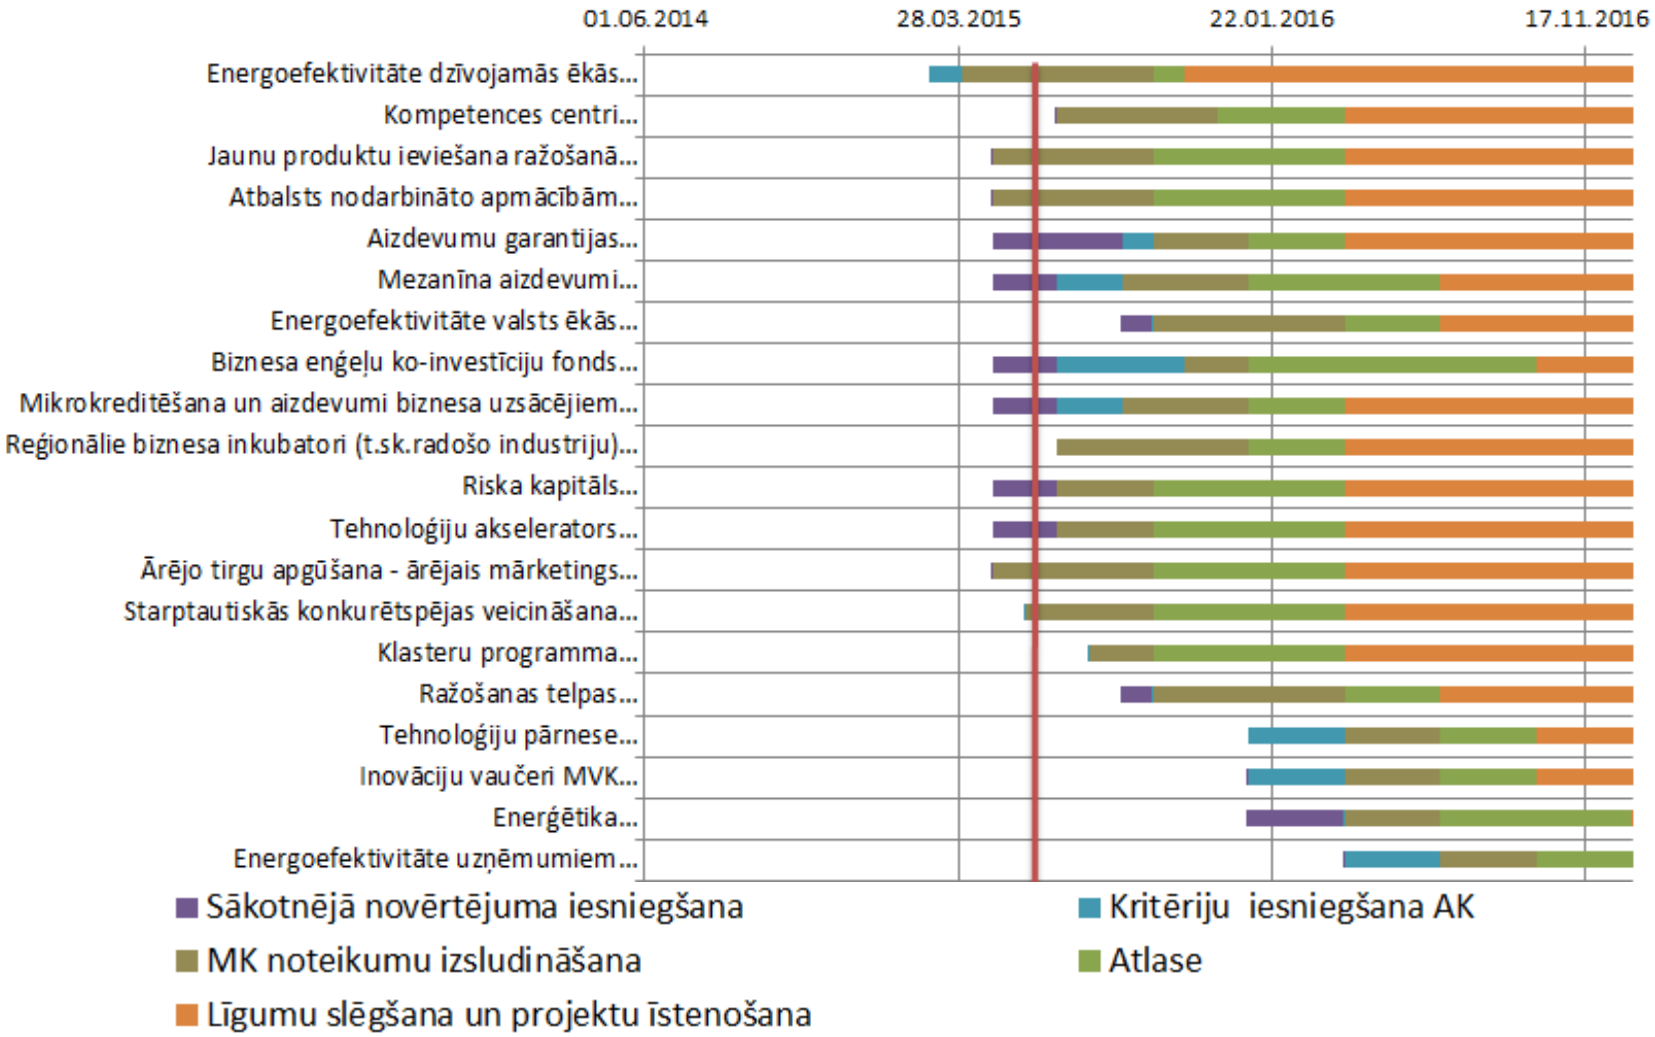


IZM ir jāveic vairāki priekšdarbi, lai nodrošinātu savlaicīgu SAM ieviešanu (izglītības infrastruktūras kartējums, mūžizglītības un karjeras pasākumu plānošanas dokumentu izstrāde,, ZTAI pamatnostādņu 2014.–2020.gadam īstenošanas rīcības plāns, sākotnējie novērtējumi u.c.)

# SAM ieviešanas laika grafiks LM




Labklājības ministrijai ir vislielākais progress SAM ieviešanas nosacījumu izstrādē.

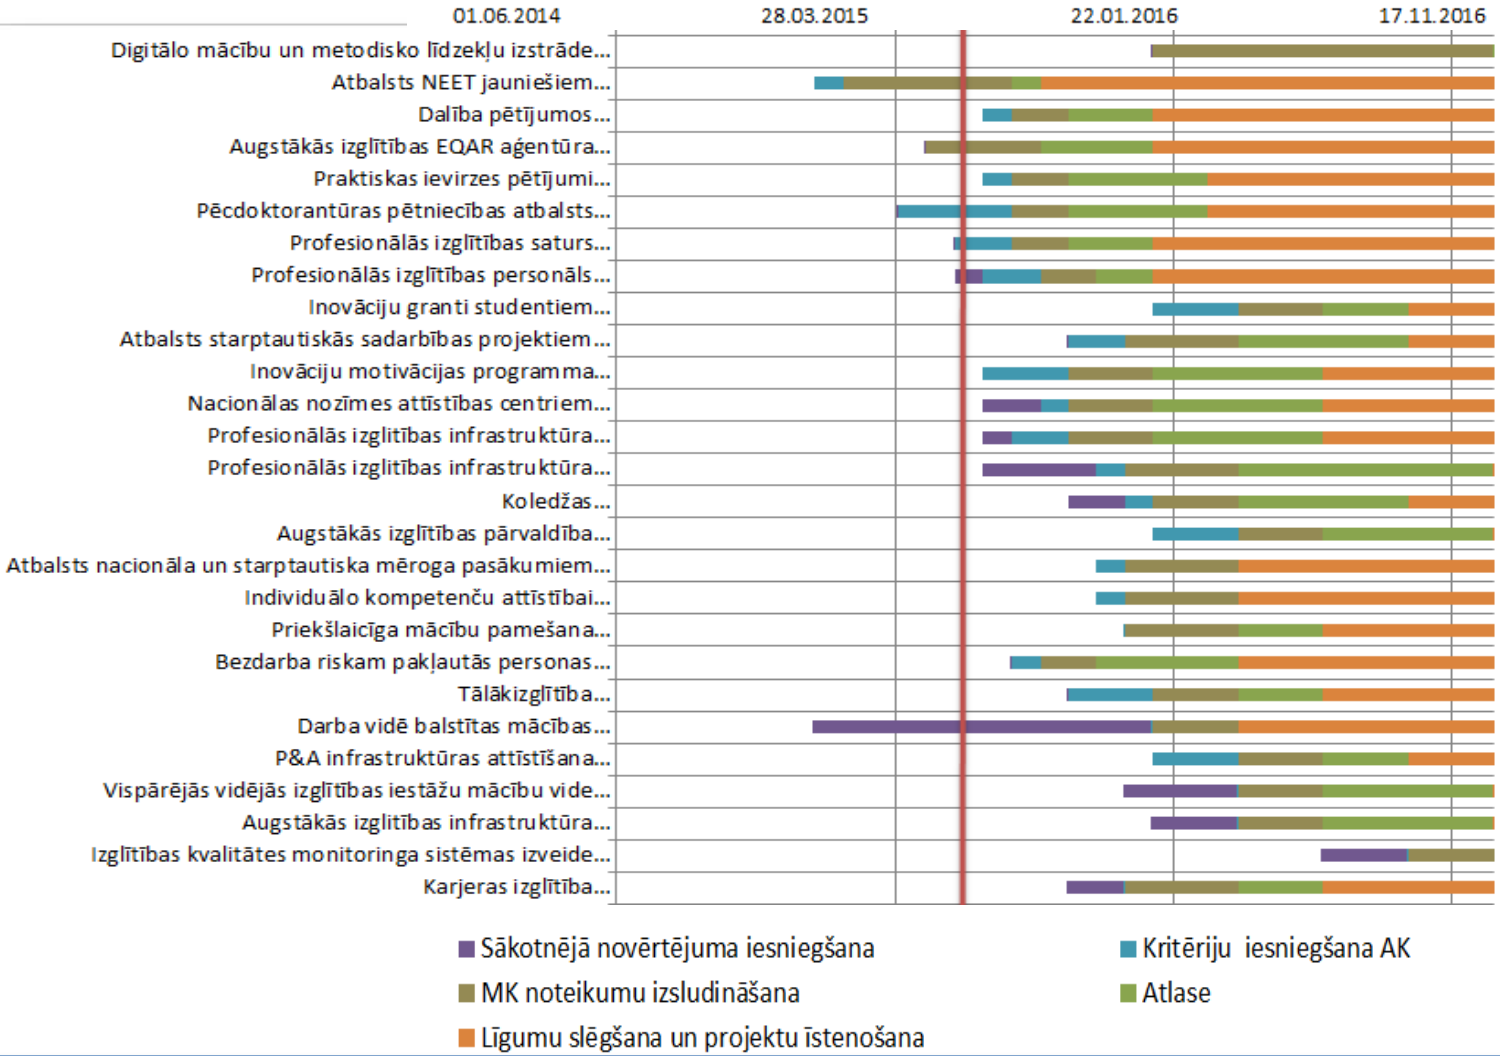LATVIJAS REPUBLIKAS
FINANŠU MINISTRIJA

# SAM ieviešanas laika grafiks VARAM

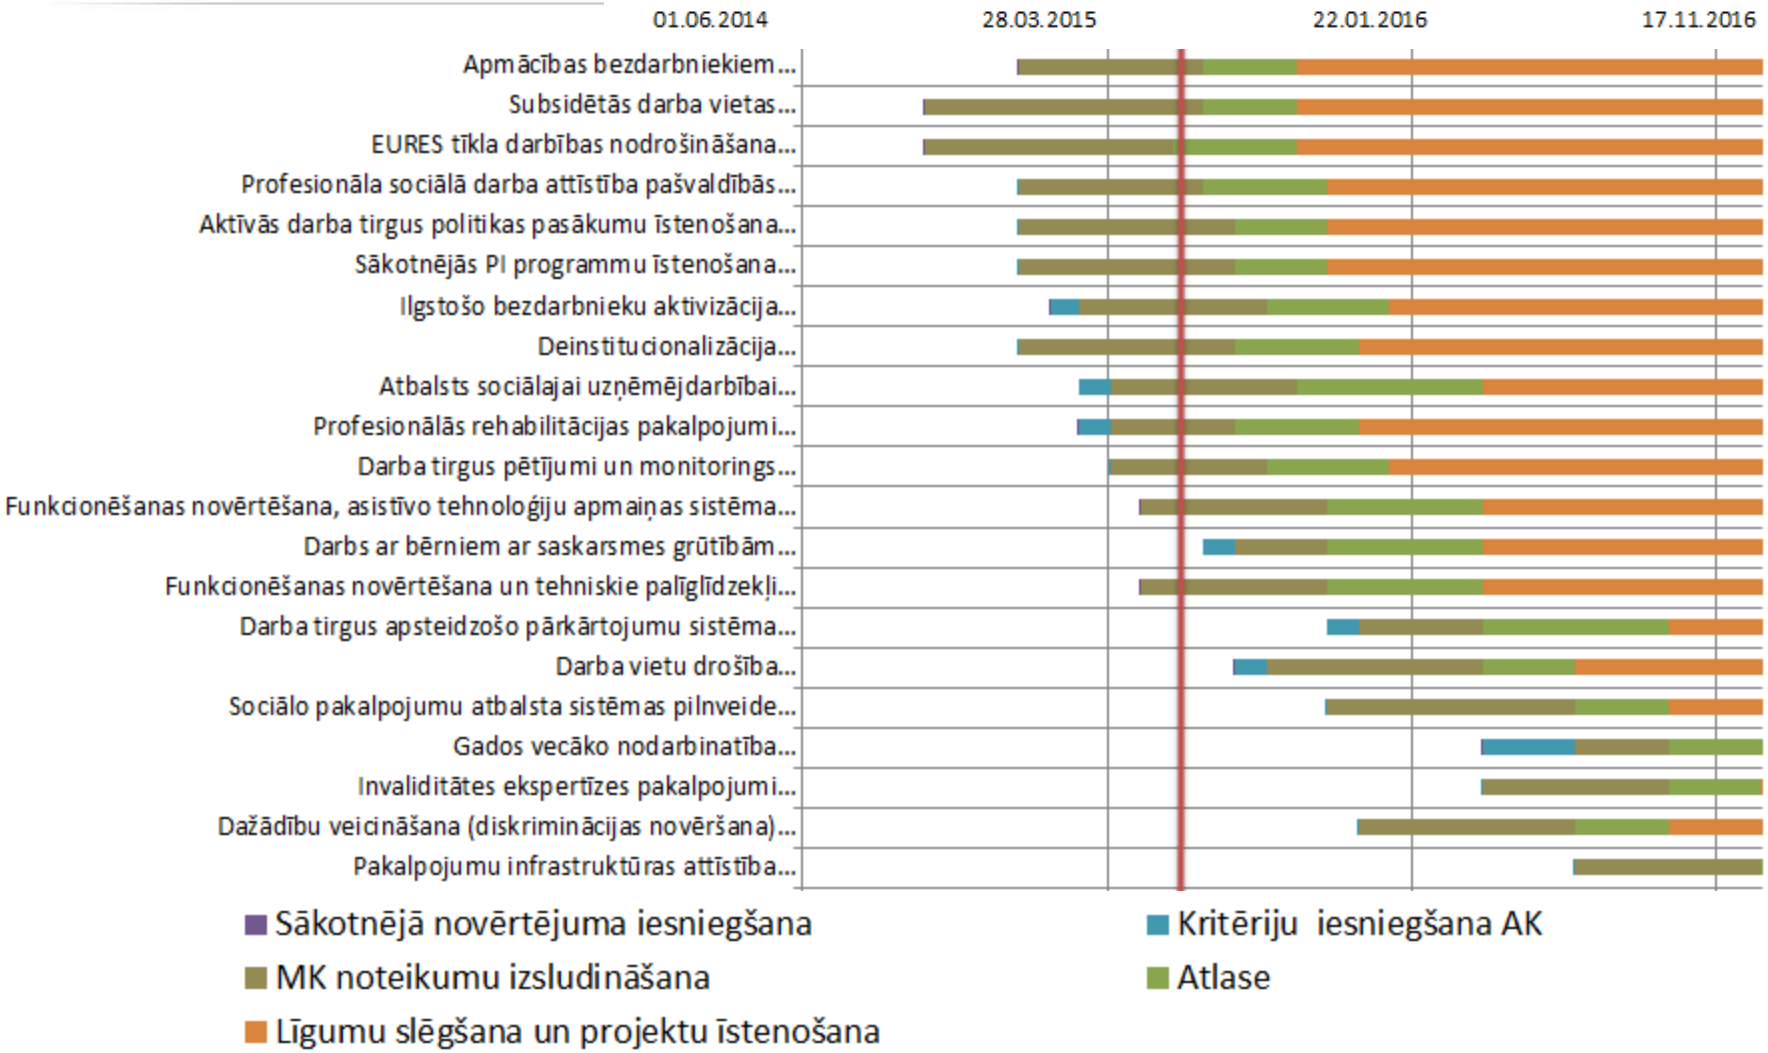


VARAM ir jāveic vairāki priekšdarbi, lai nodrošinātu savlaicīgu SAM ieviešanu (plūdu plāns (t.sk. ZM), IKT mērķarhitekrūras izstrāde, atkritumu plānu izstrāde, teritoriju attīstības plānu izvērtēšana (t.sk. pašvaldību), u.c.)

# Secinājumi

- ES fondu plānošanas dokumentos ieskicētais kopējais prioritāšu izklāsts un finansējuma sadalījums atbilst kopējiem Eiropas Komisijas un Eiropa 2020 uzstādījumiem, kā arī NAP 2014–2020 noteiktajām prioritātēm.
- Būtiska ir savlaicīga ex-ante nosacījumu izpilde un SAM ieviešanas uzsākšana, lai nodrošinātu laicīgu investīciju uzsākšanu un snieguma ietvara finanšu mērķu sasniegšanu līdz 2018.gadam (FM š.g. 13.martā organizēja semināru atbildīgo iestāžu valsts sekretāriem un valsts sekretāru vietniekiem ES fondu jautājumos, kura ietvaros tā dalībnieki tika iepazīstināti ar ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda aktualitātēm un turpmākajiem darbiem).

LATVIJAS REPUBLIKAS
FINANŠU MINISTRIJA

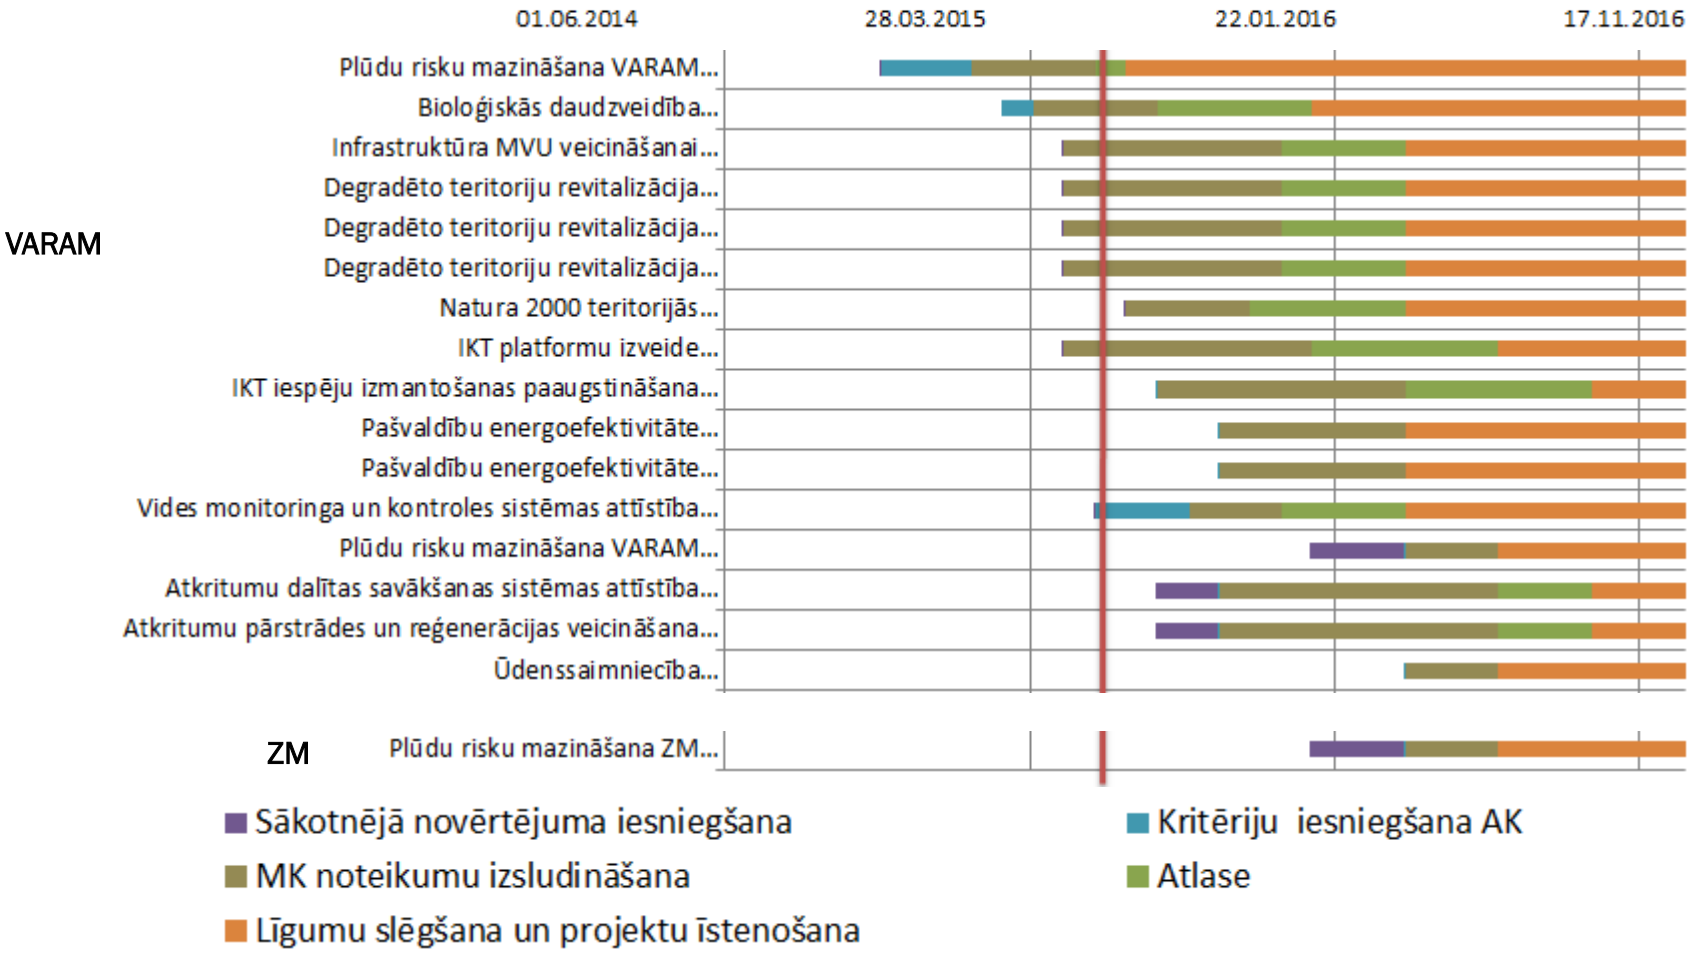Paldies par uzmanību!

Vairāk informācijas:

www.esfondi.lv
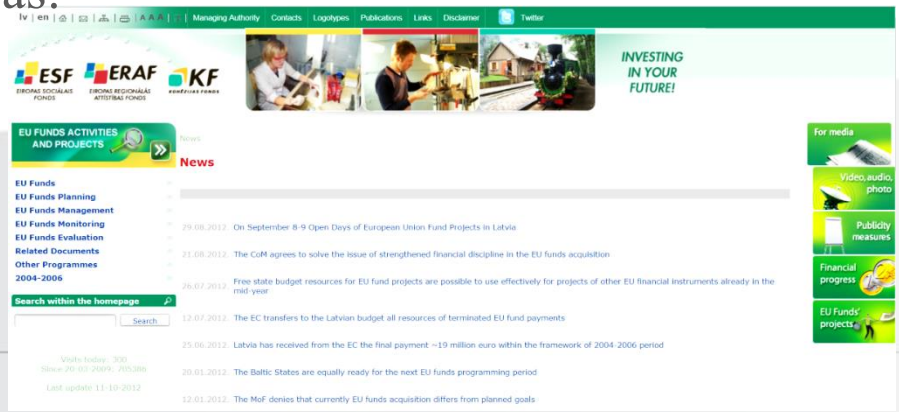
www.fm.gov.lv
